		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**WP1 - Project set-up**	**0.5 days**	**02/11/2026, 11:15**	**02/11/2026, 15:15**	
2		Kick off and agree team roles	0.125 days	02/11/2026, 11:15	02/11/2026, 12:15	
3		Make a Gantt chart and time plan	0.375 days	02/11/2026, 12:15	02/11/2026, 15:15	2
4		Find a partener team	0.031 days	02/11/2026, 12:15	02/11/2026, 12:30	
5		**WP2 - Quality management**	**2.646 days**	**02/11/2026, 15:30**	**05/11/2026, 10:40**	
6		QMS folder and document register set up	2 days	02/11/2026, 15:30	04/11/2026, 14:30	3
7		Practice audit	0.062 days	04/11/2026, 14:30	04/11/2026, 15:00	6
8		QMS Audit	0.021 days	05/11/2026, 10:00	05/11/2026, 10:10	7
9		Buffer	0.062 days	05/11/2026, 10:10	05/11/2026, 10:40	
10		**WP3 - Signal acquisition**	**3.469 days**	**03/11/2026, 11:00**	**06/11/2026, 12:45**	
11		Write test plan	0.125 days	03/11/2026, 11:00	03/11/2026, 12:00	4
12		Collect kit	0.062 days	03/11/2026, 12:00	03/11/2026, 12:30	4
13		Set up kit and read the signal	0.375 days	03/11/2026, 13:30	03/11/2026, 16:30	12
14		Record data	0.312 days	03/11/2026, 16:30	04/11/2026, 10:00	13
15		Return kit	0.062 days	06/11/2026, 12:15	06/11/2026, 12:45	
16		Buffer	0.062 days	04/11/2026, 10:00	04/11/2026, 10:30	
17		**WP4 - Signal processing**	**1.812 days**	**04/11/2026, 10:00**	**05/11/2026, 16:30**	
18		Get EMG signals from the test/ databbase	0.125 days	04/11/2026, 10:00	04/11/2026, 11:00	14
19		EMG noise reduction and feature detection	0.188 days	04/11/2026, 12:00	04/11/2026, 14:30	18
20		EMG investigations	0.562 days	04/11/2026, 16:00	05/11/2026, 11:30	19
21		Buffer	0.062 days	05/11/2026, 16:00	05/11/2026, 16:30	
22		**WP5 - Presentation**	**3.021 days?**	**05/11/2026, 11:30**	**10/11/2026, 09:40**	
23		Scientific EMG research	2 days?	05/11/2026, 11:30	09/11/2026, 09:30	20
24		Individual presentation preparation	0.708 days	09/11/2026, 09:30	09/11/2026, 16:10	23
25		Individual presentation submission	0.062 days	09/11/2026, 16:10	09/11/2026, 16:40	24
26		Final presentation	0.25 days	09/11/2026, 16:40	10/11/2026, 09:40	25

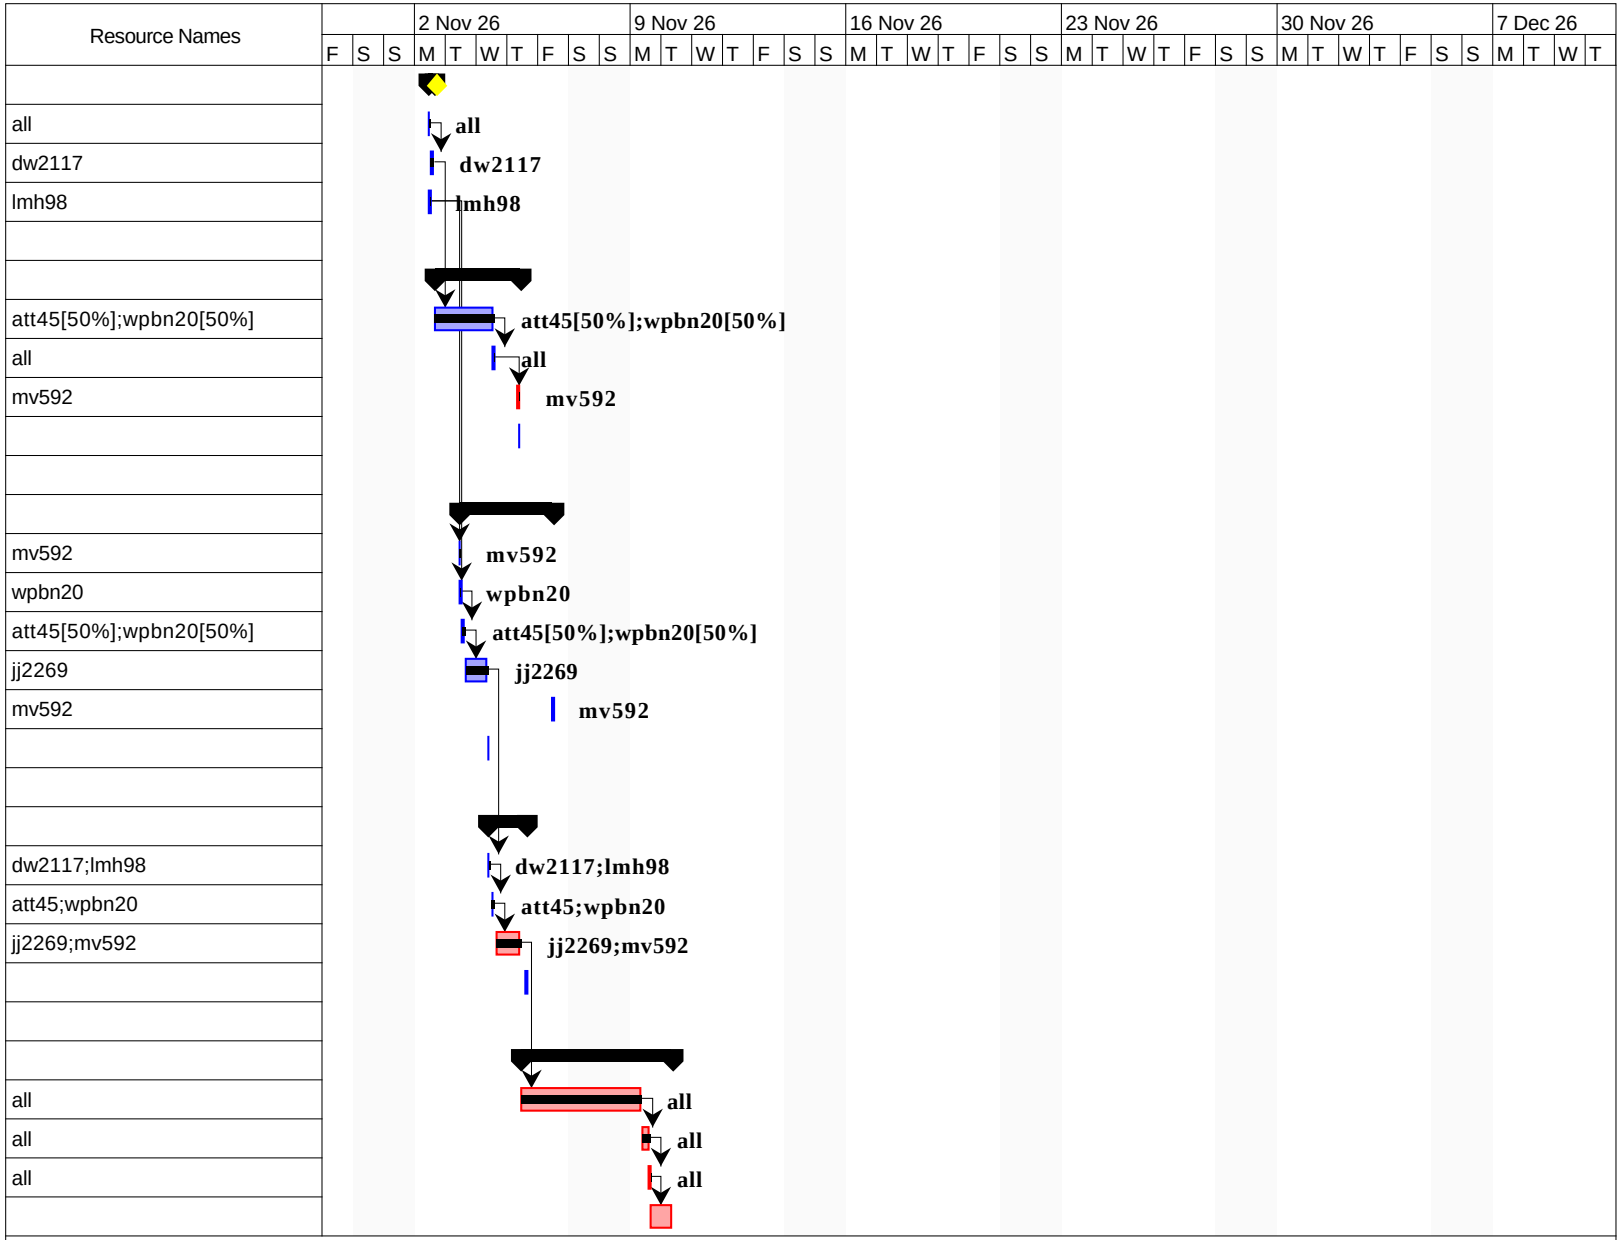
Resource Names
2 Nov 26
9 Nov 26
16 Nov 26
23 Nov 26
30 Nov 26
7 Dec 26
F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T
all
dw2117
lmh98
att45[50%];wpbn20[50%]
all
mv592
mv592
wpbn20
att45[50%];wpbn20[50%]
jj2269
mv592
dw2117;lmh98
att45;wpbn20
jj2269;mv592
all
all
all
